




# تقرير شهر ابريل 2024

## شهادات من يهमे الأمر ( لإصدار اذونات البناء )

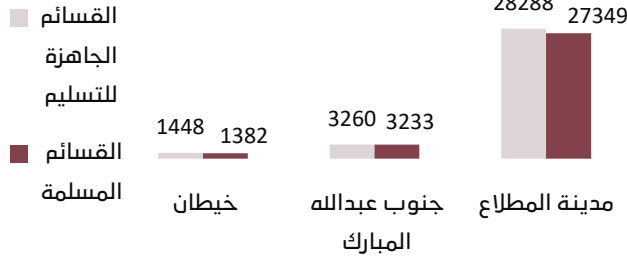

## عدد المباني العامة تحت التنفيذ

- إجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 74
- مدينة المطلاع السكنية: 22
- جنوب عبد الله المبارك : 31
- شرق صباح الأحمد: 16
- توسعة الوفرة : 3
- خيطان الجنوبي: 1
- جابر الأحمد: 1



عدد الطلبات القائمة: 96315



## عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين

تطبيق سهل : 18371  
الموقع الإلكتروني : 25  
مراكز المؤسسة : 666



## عدد العقود ( الإنشائية والاشراف ) التي

### تم توقيعها : 2 عقود

- إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة الخاصة بالضواحي N5,N6,N7,N9  
بمشروع مدينة المطلاع السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة الخاصة بالضواحي N7,N8,N9,N10,N12  
بمشروع مدينة المطلاع السكنية



## المشاريع التنفيذية ( البنية التحتية ) للمشاريع الإسكانية

### مشروع شرق صباح الأحمد ( 1184 بيت )

- العقد الأول : 587 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 89.61%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 87.84%
- العقد الثاني: 597 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 100%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 80.97%

### مشروع توسعة الوفرة ( 53 قسيمة صناعية )

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 99.84%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 64.84%

### مشروع مدينة صباح الأحمد

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 5.40%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 12.56%

### مشروع مدينة جنوب سعد عبدالله

- عقد الطر ق رئيسية
- المشروع بالفترة التعاقدية 0.05%
- نسبة الإنجاز الفعلية : 1.76%



## المشاريع السكنية قيد التوزيع

### مدينة جنوب سعد عبدالله

- إجمالي الوحدات السكنية: 24,508
- القسائم السكنية: 23,551
- المنتجات الإسكانية: 957
- المخصصين لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007
- إجمالي عدد المخصصين : 6794
- إجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 317
- إجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع : 14,359

