




تقرير شهر مارس 2024

شهادات من يهमे الأمر (لإصدار اذونات البناء)

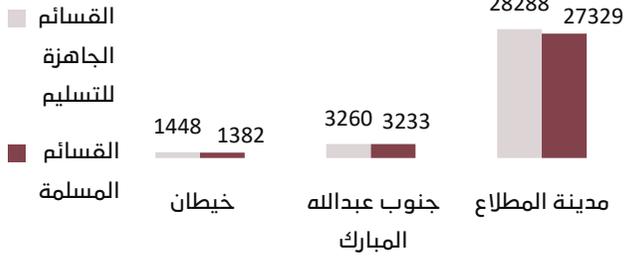

عدد المباني العامة تحت التنفيذ

- إجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 78
- مدينة المطلاع السكنية : 27
- جنوب عبد الله المبارك : 31
- شرق صباح الأحمد : 16
- توسعة الوفرة : 3
- خيطان الجنوبي: 1



عدد الطلبات القائمة: 96090

عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين

تطبيق سهل : 18788
الموقع الالكتروني : 18
مراكز المؤسسة : 732

عدد العقود (الإنشائية والاشراف) التي

تم توقيعها : 4 عقود

- توريد و تركيب و تنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق الرئيسية و أعمال إشارات المرور و كاميرات الضبط المروري و لوحات الرسائل المتغيرة (الجزء الثاني) بمشروع مدينة المطلاع السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب بمدينة صباح الأحمد السكنية قطاع (B)
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز فتيات بمدينة صباح الأحمد السكنية قطاع (D)
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة عدد (3) محطات تحويل رئيسية جهد 132/11 ك. ف. بالضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الأحمد



المشاريع التنفيذية (البنية التحتية) للمشاريع الإسكانية

مشروع شرق صباح الأحمد (1184 بيت)

- العقد الأول : 587 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 99.51%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 87.30%
- العقد الثاني: 597 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 77.15%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 96.13%

مشروع توسعة الوفرة (53 قسيمة صناعية)

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 99.46%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 64.84%

مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 2.52%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 8.38%

مشروع مدينة جنوب سعد عبدالله

- عقد الطر ق رئيسية
- المشروع بالفترة التحضيرية
- نسبة الإنجاز الفعلية : 1:24%



المشاريع السكنية قيد التوزيع

مدينة جنوب سعد عبدالله

- إجمالي الوحدات السكنية: 24,508
- القوائم السكنية: 23,551
- المنتجات الإسكانية: 957
- المخصصين لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007
- إجمالي عدد المخصصين : 6829
- إجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 267
- إجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع : 14,042

عدد المناقصات (الإنشائية والخدمات) التي تم طرحها : 6



- إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6,568 وحدة سكنية للضواحي (N1,N2,N3,N11) بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب بالقطاع (c) بمدينة صباح الأحمد السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب بالقطاع (E) بمدينة صباح الأحمد السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز فتيات بمدينة صباح الأحمد السكنية قطاع (A)
- إنشاء وإنجاز وصيانة مركز فتيات بمدينة سعد عبدالله ق 9
- توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خوادم رئيسية وأجهزة ملحقة لغرفة الخدمات الرئيسية بالمؤسسة العامة للرعاية

